


Estructura Organizacional del Centro de Innovación

Organigrama Formal

La estructura institucional aprobada se mantiene:

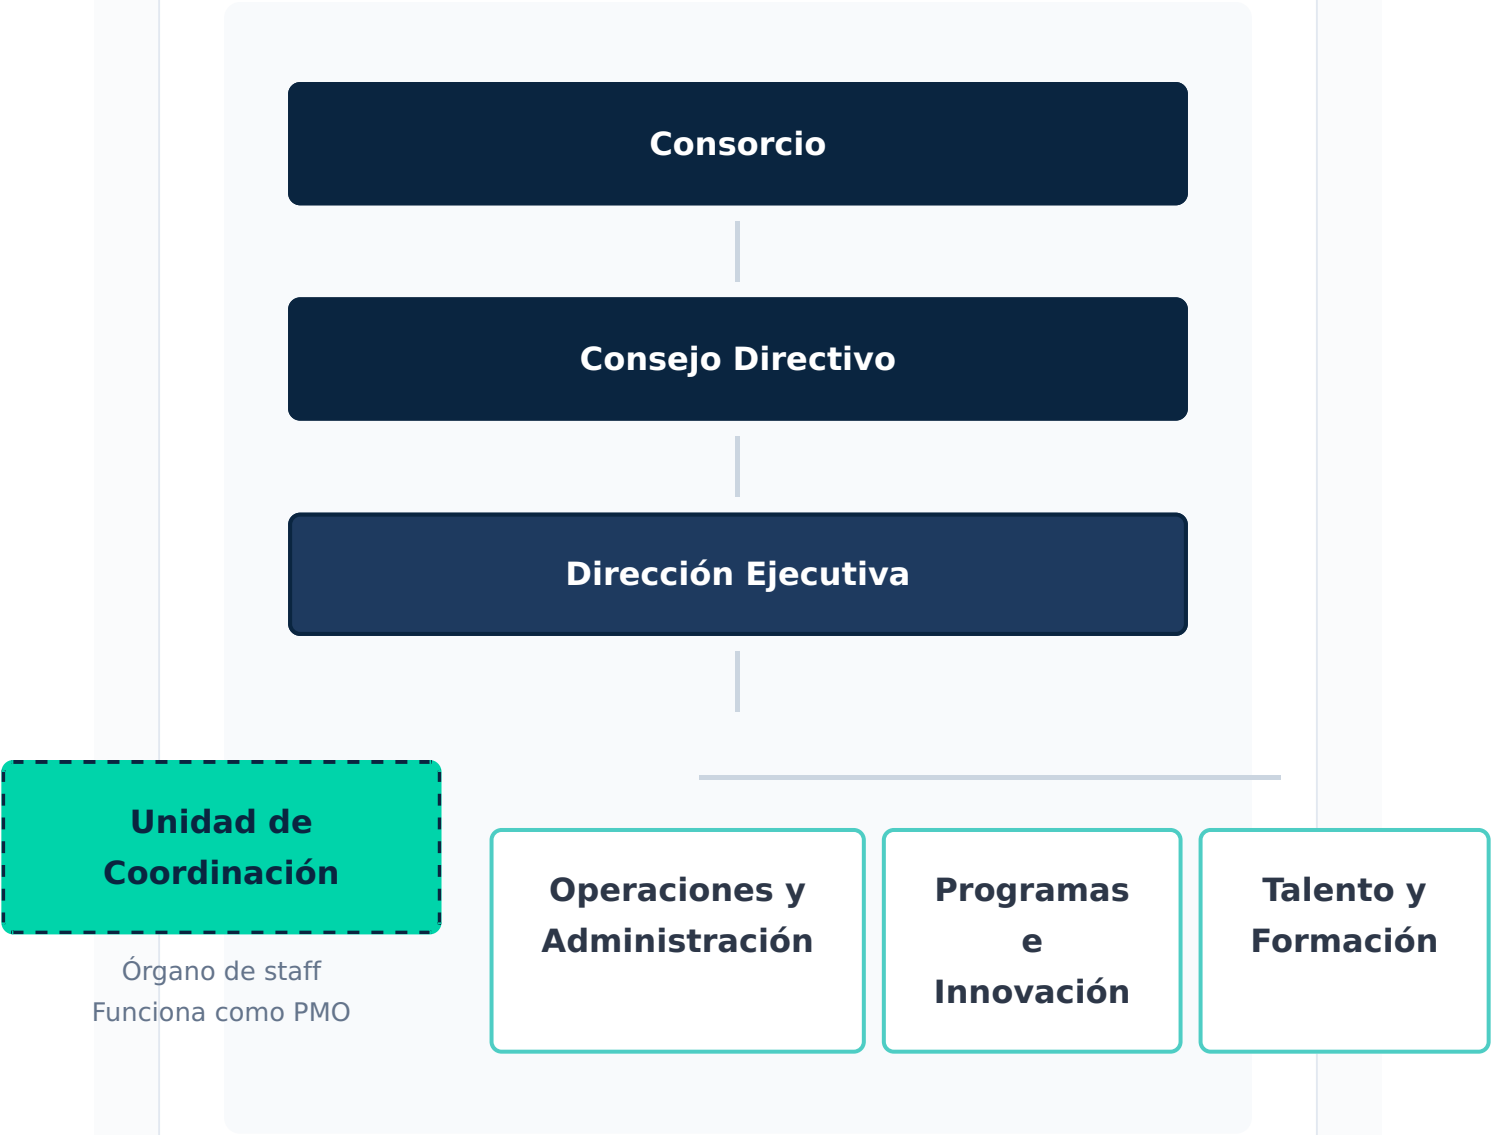

- **Consortio:** Administración del activo físico

- **Consejo Directivo:** Supervisión estratégica
- **Dirección Ejecutiva:** Conducción operativa
- **Unidad de Coordinación:** Órgano de staff, opera como PMO
- **Tres Gerencias:** Áreas funcionales base

Unidad de Coordinación / PMO

Es un órgano de staff que coordina las misiones estratégicas del Centro.

Función	Descripción
Gestión de misiones	Coordina las misiones estratégicas en ejecución
Seguimiento	Mantiene dashboard de progreso y KPIs
Coordinación	Facilita trabajo entre gerencias
Reporting	Reporta a Dirección Ejecutiva

Composición:

- Inicio: 1 Coordinador PMO
- Expansión: 2-3 personas
- Madurez: 3-4 personas

Modelo de Trabajo Matricial

El Centro opera con modelo matricial. Las personas trabajan para su gerencia de origen y para las misiones estratégicas según la asignación definida.

Cada misión tiene un líder responsable que coordina un equipo con personas de distintas gerencias.

Ejemplo: La misión "Atracción de Empresas" tiene un líder y un equipo formado por personas de las gerencias de Operaciones, Programas y Talento.

Gobernanza:

- Cada persona reporta a su gerente funcional y al líder de su misión
- El PMO coordina entre gerencias y misiones
- Los conflictos de prioridad se resuelven en Dirección Ejecutiva

Evolución de la Estructura

La estructura organizacional se completa progresivamente según las misiones que se lanzan:

Fase 1
0-6 meses

Estructura
formal
operativa
PMO activo
2 misiones
piloto

Fase 2
6-18 meses

Portfolio de
4-5 misiones
PMO
expandido
Modelo
matricial
consolidado

Fase 3
**18-36
meses**

5-6 misiones
Vínculos
ecosistémicos
Estructura
madura

La estructura se construye según las necesidades reales de las misiones, no se diseña completa al inicio.

Implementación

Momento	Acción
Mes 1	Contratar Coordinador PMO Seleccionar primeras misiones
Mes 2	Nombrar líderes de misión Formar equipos Lanzar misiones
Mes 3	Dashboard activo Primeros reportes de progreso

Mes 6

Evaluación de resultados
Decisión sobre expansión

Principios Organizacionales

- La estructura formal es la base institucional aprobada
- El PMO coordina desde el inicio
- Las misiones definen la estructura operativa
- La organización crece según las misiones que se lanzan
- Las gerencias son la base estable
- Las misiones son la capa dinámica

Modelo Organizacional Visual

Diagrama completo del modelo organizacional implementado:

MODELO ORGANIZACIONAL DEL DISTRITO I – CENTRO DE INNOVACIÓN

Estructura institucional permanente y sistema de funcionamiento con evolución progresiva

